

ПЛАН ЗАПУСКА ПРОЕКТА

За 10 дней — от фундамента до запуска

Mobile-web сервис предзаказа напитков. Что и в какой последовательности делается по каждому дню.

10

РАБОЧИХ ДНЕЙ · ≈ 2 НЕДЕЛИ

202 ч

ОБЪЁМ ПО СМЕТЕ


500 000 ₽

К ОПЛАТЕ · СКИДКА 5 000 ₽

RU / AR

ДВЕ ЛОКАЛИ

Весь путь на одном экране

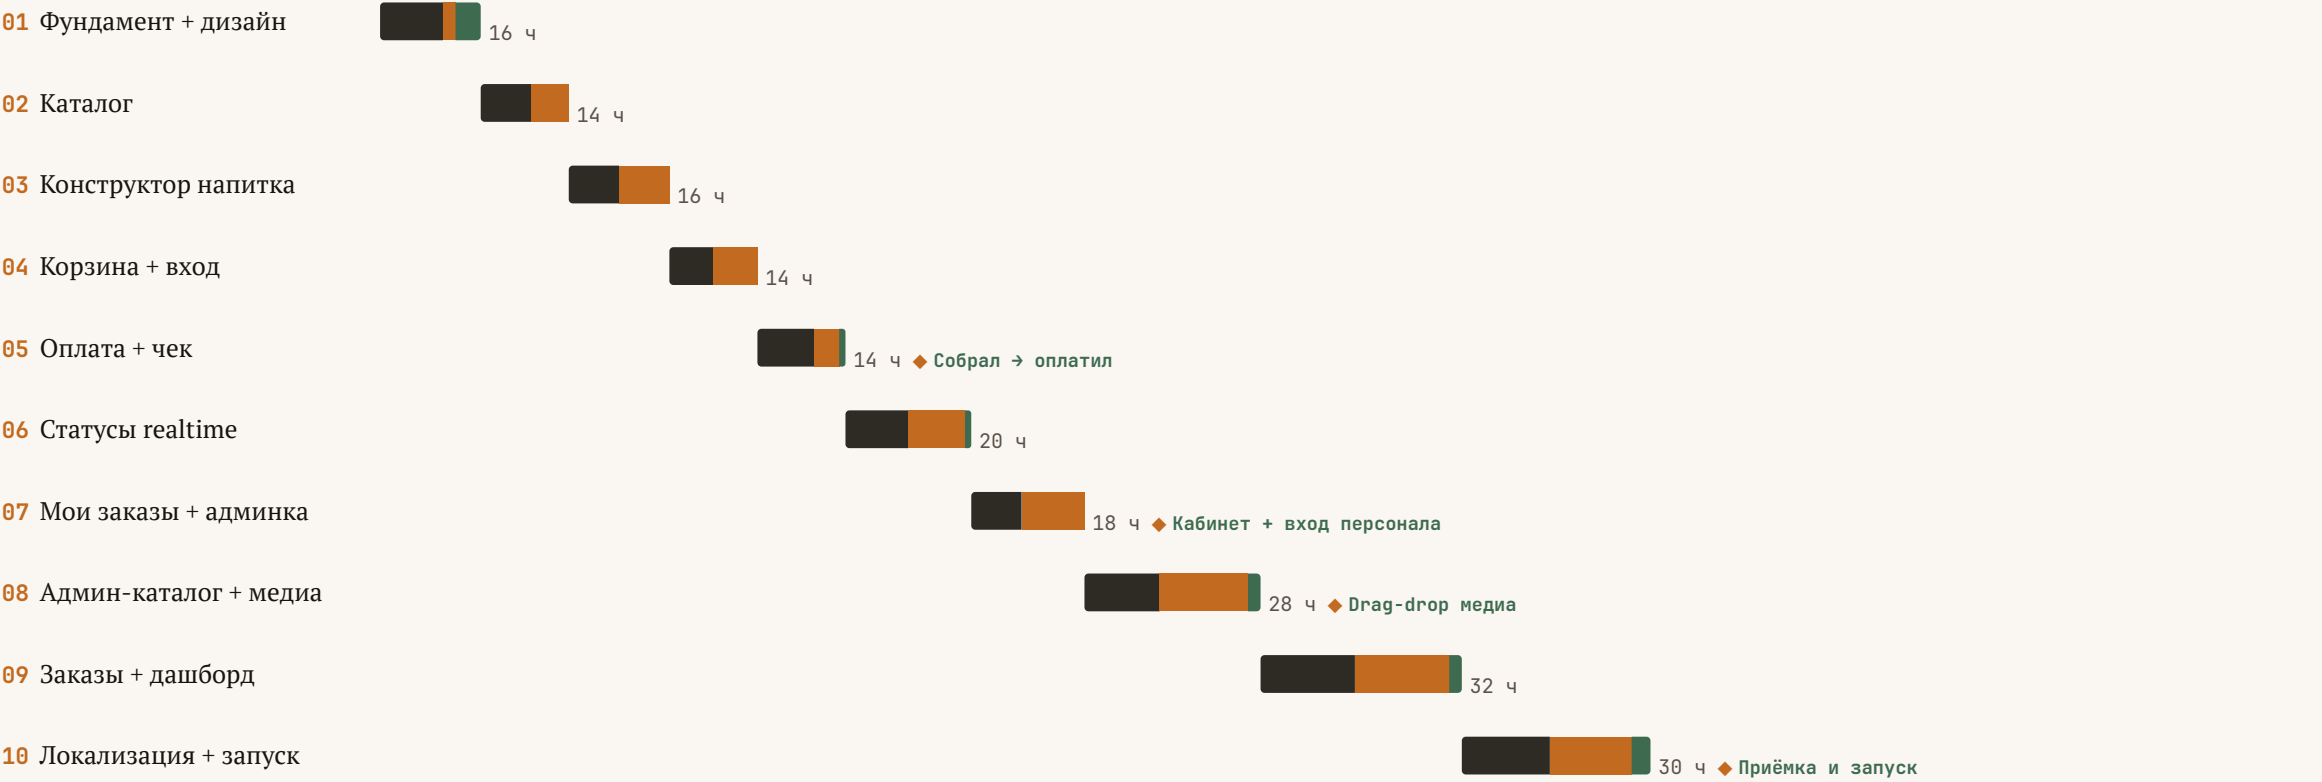

■ Бэкенд 101 ч ■ Фронтенд 88 ч ■ Дизайн 13 ч ◆ Контрольная точка

Длина полосы = часы по смете. Каждый этап начинается там, где закончился предыдущий.

★ **БОНУС** Сверх сметы и без доплаты: приём заказов по рабочим часам точки (подробнее — отдельный слайд).

01

Фундамент и дизайн-система

СМЕТА: №1 Инфраструктура · №13 Дизайн 9 экранов

ЦЕЛЬ Поднять «скелет» продукта и заложить единый визуальный язык.

СОСТАВ РАБОТ

- Репозиторий и окружения dev / prod
- База данных, миграции, авторизация (JWT)
- Каркасы платежей (webhook) и realtime (WebSocket)
- Базовый деплой и автосборка (CI)
- Дизайн 9 ключевых экранов — визуальная система

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Работает «пустое» приложение и вход в админку; готова дизайн-система экранов.

ГОТОВО, КОГДА

Разворачивается одной командой, проходит health-check, есть вход в админку.

ПОСЛЕ ЧЕГО

Стартовый этап — фундамент для всех дней.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ

16 ч

Б 10 · Ф 2 · Д 4 40 000 ₽

02

Каталог напитков (витрина)

СМЕТА: №2 Каталог (PUB-G-01, 02)

ЦЕЛЬ Меню, которое видит клиент.

СОСТАВ РАБОТ

- Категории напитков (данные с бэкенда)
- Список напитков и карточка напитка
- Деталка с видео

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Клиент открывает меню по категориям и карточку напитка с медиа.

ГОТОВО, КОГДА

Меню отображается из каталога, карточки и видео работают.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 1 — нужна БД.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ

14 ч

Б 8 · Ф 6 · Д 0 35 000 ₽

03

Конструктор напитка

СМЕТА: №3 Конструктор добавок (PUB-G-03)

ЦЕЛЬ Собрать напиток под себя.

СОСТАВ РАБОТ

- Связка напиток × добавка, типы выбора
- Live-пересчёт цены и КБЖУ в реальном времени

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Клиент выбирает размер и добавки, сразу видит цену и КБЖУ.

ГОТОВО, КОГДА

Конфигуратор корректно считает цену и КБЖУ на лету.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 2 — нужен каталог.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ

16 ч

Б 8 · Ф 8 · Д 0 40 000 ₽

04

Корзина и вход по телефону

СМЕТА: №4 Корзина (PUB-G-05) · №5 Авторизация по телефону (PUB-G-04)

ЦЕЛЬ Собрать заказ и узнать клиента.

СОСТАВ РАБОТ

- Корзина: несколько напитков, количество, итоги, сохранение
- Авторизация по номеру телефона

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Клиент собирает заказ из нескольких позиций и входит по телефону.

ГОТОВО, КОГДА

Заказ из нескольких позиций считается;
вход по телефону работает.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 3 — нужен конструктор.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ

14 ч

Б 7 · Ф 7 · Д 0 35 000 ₽

05

Оформление, оплата и чек

СМЕТА: №6 Оформление + оплата Stripe (PUB-A-01, 02)

ЦЕЛЬ Принять деньги.

СОСТАВ РАБОТ

- Оформление заказа
- Оплата через Stripe + подтверждение по webhook
- Чек с VAT 5 %

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Клиент оплачивает; заказ помечается оплаченным, виден расчёт чека.

ГОТОВО, КОГДА

Тестовая оплата проходит, заказ «оплачен», чек корректен.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 4. Зависит от Stripe и решения по VAT.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ

14 ч

Б 9 · Ф 4 · Д 1 35 000 ₽

06

Статусы в реальном времени + профиль

СМЕТА: №7 Статусы + realtime (PUB-A-03) · №9 Профиль + guards (PUB-A-06, 08)

ЦЕЛЬ Клиент видит прогресс, у него есть профиль.

СОСТАВ РАБОТ

- Единая статусная модель: Принят → Готовим → Готов → Выдан
- «Прибыл, готов забрать» + realtime (WebSocket)
- Профиль + состояния гость/клиент + route-guards

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Статус меняется мгновенно; у клиента есть профиль и защита маршрутов.

ГОТОВО, КОГДА

Смена статуса видна клиенту в реальном времени; гость/клиент разграничены.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 5 — статусы живут у оплаченного заказа.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ



Б 10 · Ф 9 · Д 1 50 000 ₺

07

Мои заказы + каркас админки

СМЕТА: №8 Мои заказы (PUB-A-07) · №10 Каркас админки + роли (ADM-S-06)

ЦЕЛЬ История заказов у клиента и вход для персонала.

СОСТАВ РАБОТ

- «Мои заказы»: список + деталка с историей статусов
- Каркас админки, вход персонала, роли, менеджеры

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Клиент видит свои заказы; персонал входит в админку с ролями.

ГОТОВО, КОГДА

История заказов доступна; вход персонала и роли работают.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 6.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ

18 ч

Б 8 · Ф 10 · Д 0 45 000 ₽

08

Админ-каталог: меню + drag-and-drop медиа

СМЕТА: №11 Админка-каталог (ADM-S-01...05)

ЦЕЛЬ Управлять меню самим, с удобной загрузкой медиа.

СОСТАВ РАБОТ

- Категории напитков и добавок, добавки, единицы измерения
- Напитки + привязка добавок
- Загрузка фото/видео перетаскиванием (drag-and-drop) в облако — без ручных ссылок

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Заводите напиток и перетаскиваете картинку — она сразу в меню.

ГОТОВО, КОГДА

Меню наполняется из админки, медиа грузится drag-and-drop, видно у клиента.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 7 — нужен каркас админки.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ



Б 12 · Ф 14 · Д 2 70 000 ₽

09

Админ-заказы + дашборд

СМЕТА: №12 Админка-заказы (ADM-M-01...05) · Опция 05 Дашборд (ADM-S-10)

ЦЕЛЬ Управлять заказами и видеть метрики.

СОСТАВ РАБОТ

- Админ-заказы: фильтры, «Взять в работу», статусы
- Данные клиента, история, состав заказа
- Дашборд: 9 метрик с фильтром по периоду

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Персонал ведёт заказы от приёма до выдачи; владелец видит дашборд продаж.

ГОТОВО, КОГДА

Заказы управляются из админки;
дашборд показывает данные за период.

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дня 8.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ



Б 15 · Ф 15 · Д 2 80 000 ₺

10

Клиенты/платежи, локализация RU/AR и запуск

СМЕТА: Опция 04 Клиенты + платежи (ADM-S-08, 09) · Опция 03 Локализация (PUB-A-09)

ЦЕЛЬ Две локали, реестры и публичный запуск.

СОСТАВ РАБОТ

- Локализация RU / AR + RTL + язык в профиле + переводы в админке
- Админка: клиенты с деталкой + реестр платежей
- Боевые ключи (Stripe), финальный деплой и приёмка

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАС

Приложение на двух языках, есть реестры клиентов и платежей; продукт запущен.

ГОТОВО, КОГДА

Пройдена приёмка, подключены боевые интеграции, продукт на prod (RU/AR).

ПОСЛЕ ЧЕГО

После Дней 1–9 — финал.

ОБЪЁМ ЭТАПА · ПО СМЕТЕ



Б 14 · Ф 13 · Д 3 75 000 ₺

Бонус от команды — сверх сметы

Эту возможность мы **доработаем отдельно, без отдельной оплаты** — чтобы в проекте она тоже была. В смету **202 ч / 500 000 ₽** не входит.

★ Часы приёма заказов

Приём заказов — только когда точка реально работает и может их выполнить.

- Рабочие часы точки задаются в админке по дням недели, с учётом часового пояса.
- Вне расписания оформить заказ нельзя — клиент видит понятное сообщение «точка закрыта».
- Снимает заказы «в закрытую» и связанные с ними отмены, возвраты и недовольство клиентов.

Почему это важно. Заказы принимаются только в рабочие часы точки — меньше заказов «в закрытую», отмен и недовольных клиентов. Реализуем параллельно на этапе админ-заказов (День 9).

Вехи и зависимости

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРИЁМКИ

◆ День 5 Сквозной заказ с оплатой: собрал → вошёл → оплатил	◆ День 7 Личный кабинет клиента + вход персонала в админку	◆ День 8 Полное самоуправление меню + drag-and-drop медиа	◆ День 10 Финальная приёмка и публичный запуск (RU/AR)
--	---	--	---

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОСТОЕВ

- **Stripe** · к Дню 5

аккаунт продавца (merchant) + TRN/VAT для приёма реальных платежей
- **Решения** · к Дню 5

модель VAT (в цене / сверху), минимальная сумма заказа

- **Контент** · к Дням 2 и 8

логотип, фото/видео напитков, тексты, часы работы точек
